DF CASSONETTI RIQUALIFICA AVVOLGIBILI CENTROMURO

DeFAVERI — OLTRETUTTO SEMPLICE

RESET — Partner KlimaHaus CasaClima — ANIT Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico

RIQUALIFICA CENTROMURO

Cliente:	**Tel:**
Riferimento:	**Data:**
Indirizzo consegna:	

MEZZI DI CONSEGNA: ◉ Bilico ○ Motrice

☐ **PREVENTIVO** ☐ **ORDINE** Rif. Offerta ____ /Pr

!! ATTENZIONE !! STEP DI MISURA OGNI 5 MM — Inserire misure in millimetri

LUCE ARCHITETTONICA					SPOSTAMENTO LATERALE (MIN 100)		QUOTE INFISSO OBBLIGATORIE	
Rif.	Q.tà	L	H	Lato Motore	SX	DX	P	B

LEGENDA: In **Lato Motore** indicare dove posizionare il motore DX o SX vista interna, di conseguenza viene posizionato il foro alimentazione. In Spostamento DX - SX indicare la maggiorazione laterale del cassonetto oltre la larghezza architettonica, le quote si riferiscono alla VISTA INTERNA . La quota **P** e la quota **B** vanno **sempre inserite.**
Nella Luce architettonica indicare H solo se si vuole anche il motore, in questo caso indicare il peso dell'avvolgibile nell'apposita casella.

NOTE

MOTORI: _____
(DF HIBRA - Somfy Pulsante - Somfy Ilmo - Somfy Altus rs io - Solo staffe - Staffe+calotta+rullo)

FIANCHI CASSONETTI: _____ (Legno-Coibentati) **RULLO:** _____ (Ø60 - Ø70)

CASSONETTO FLOTTANTE: _____
(Con celino - Senza celino)

AVVOLGIBILI NON forniti da DeFAVERI
(Da compilare se richiesto il motore)

Modello: _____

Peso kg\mq: _____

IMPORTANTE: allegare scheda tecnica avvolgibile

CASSONETTO STANDARD

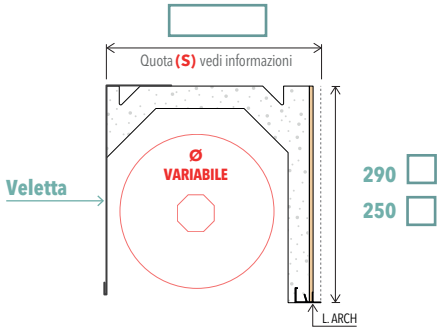

ISPEZIONE CASS. STANDARD

☐ Tampone ☐ Frontale



WINDOW BOX 360X330

☐ Frontale

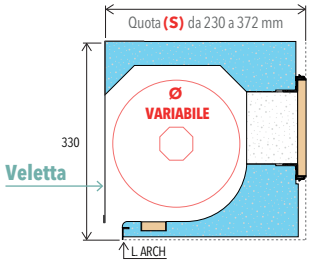

INFORMAZIONI

Cassonetto: In relazione alla quota **(S)** la forma del cassonetto può risultare diversa rispetto al disegno a fianco. La quota **(S)** massima può essere di **311**mm per cassonetto **300x250** & **300x290** (certificato) oppure **372**mm con cassonetto da **360x290**.

INTERNO CONTROTELAIO

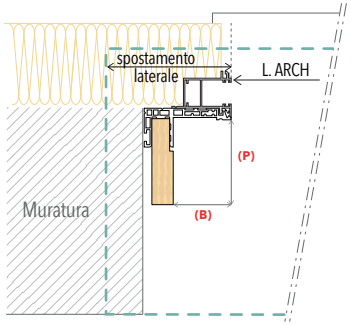

E' SEVERAMENTE PROIBITA LA RIPRODUZIONE DI TUTTO O PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO.
